【工事名称】

【施工計画図】 -STEP8-

施工フロー	
STEP1	仮囲い設置/植栽撤去/乗入工事
STEP2	内装解体
STEP3	地下流動化処理土埋戻し
STEP4	外部養生足場組立/重機搬入
STEP5	躯体一部先行解体/内装材搬出
STEP6	サポート設置/重機揚重/ゲージシステム設置
STEP7	重機搬入
STEP8	階上解体(塔屋～3階)
STEP9	地上解体(1.2階)
STEP10	基礎撤去(地下部以外)
STEP11	埋戻し/整地/山留設置(山留業者引き渡し)
STEP12	基礎撤去(残置箇所)
STEP13	火打ち設置箇所解体
STEP14	火打ち設置
STEP15	地下部基礎解体
STEP16	旧浄化槽、防火水槽解体
STEP17	埋戻し/整地

凡　例	
	敷地境界線を示す
	仮囲いを示す
	工事車両動線を示す
	誘導員を示す
	出入口仮設パネルゲート(W10m)を示す
	解体範囲を示す

使用重機/台数	
0.45㎥解体用重機	2台
0.7㎥解体用重機	1台

全体平面図【A3】S＝1/400

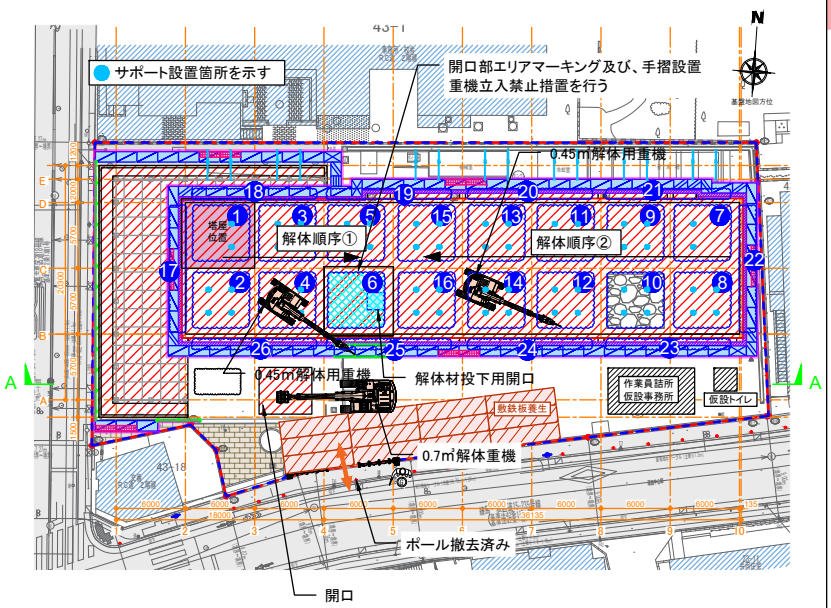

階上解体要領A-A断面図【A3】S＝1/400

1

塔屋・5F解体(内部解体・壁倒し)

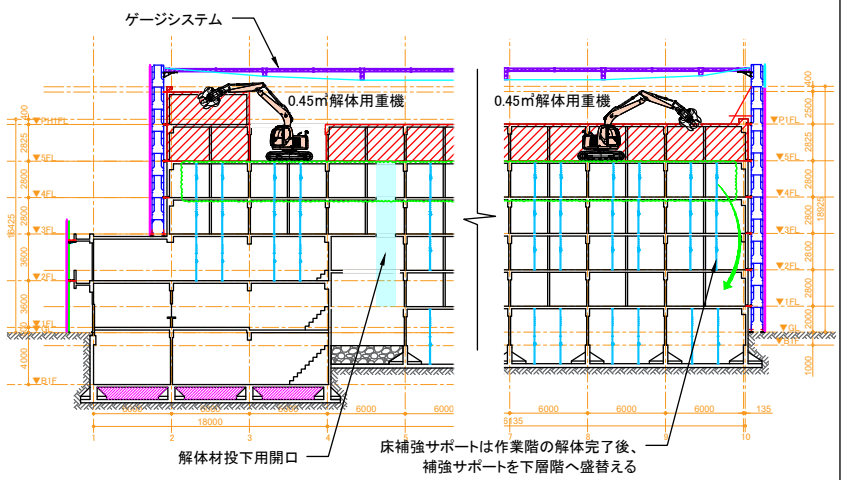

階上解体要領A-A断面図【A3】S＝1/400

2

スラブに開口を作成し、破砕ガラにてスロープを作成し、下階に移動。
下階の解体。
工事進捗に応じて頂部のゲージシステムを下げ、足場は適宜解体とする。

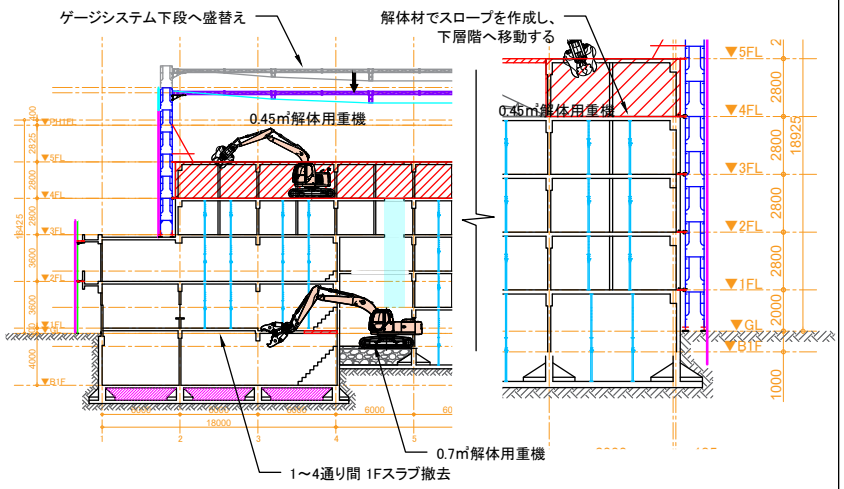

階上解体要領A-A断面図【A3】S＝1/400

3

破砕ガラを搬出用開口に投下し、地下部をガラにて埋戻す。
2・3の作業を繰り返し、3Fまで解体する。

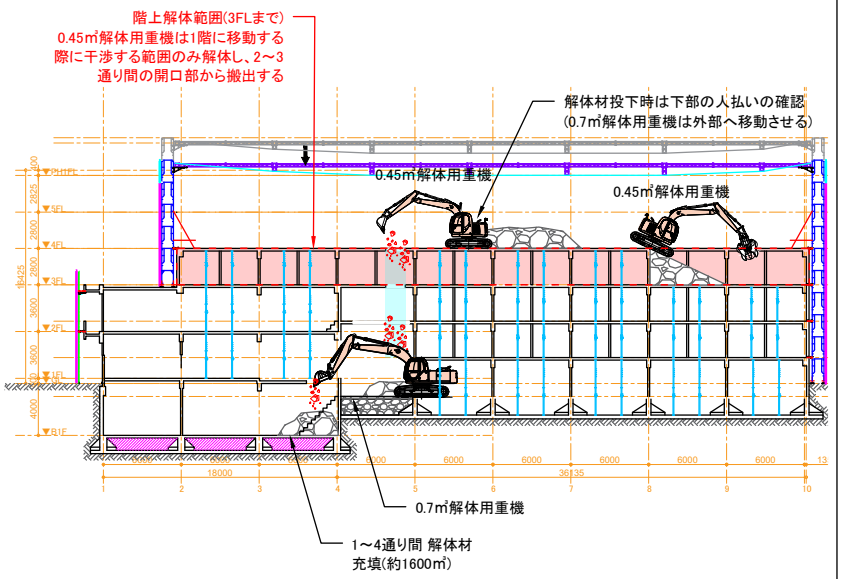

〔作成者〕	〔製図年月日〕	〔工事名称〕	〔図面番号〕
	〔縮尺〕 A3 - 図示	〔図面名称〕 施工計画図	施工-08 No.
